



Planning & rétroplanning

Phasage du projet de refonte — avril à juin 2026

RÉDACTEUR
Théo Birost

STRUCTURE
AER BFC

PÉRIODE
Avril – Juin 2026

ÉCHÉANCE FINALE
Forum — 8 déc. 2026

VERSION
v1.1

1 Logique de rétroplanning


Du résultat attendu vers les tâches

Le planning est construit à **rebours** à partir des échéances : la **soutenance de fin de stage (27 juin)** impose une mise en ligne avant cette date, et **l'édition 2026 du Forum (8 décembre)** exige un site stable bien avant l'ouverture des inscriptions et la communication de l'événement. On remonte donc de ces deadlines vers le cadrage. Contrainte structurante : tenir la refonte en **~2 mois**, tout en **maintenant l'ancien site en ligne**.

2 Jalons clés

DATE	JALON	STATUT
26 févr. 2026	Cahier des charges validé	ATTEINT
Avril 2026	Démarrage du stage & cadrage	ATTEINT
18 mai 2026	Déblocage version PHP serveur → intégration possible	ATTEINT
Juin 2026	Mise en ligne (bascule préprod → production)	ATTEINT
27 juin 2026	Soutenance de stage	À VENIR
8 déc. 2026	Forum H ₂ — 6 ^e édition (Axone de Montbéliard)	ÉCHÉANCE

3 Diagramme de phases (Gantt)

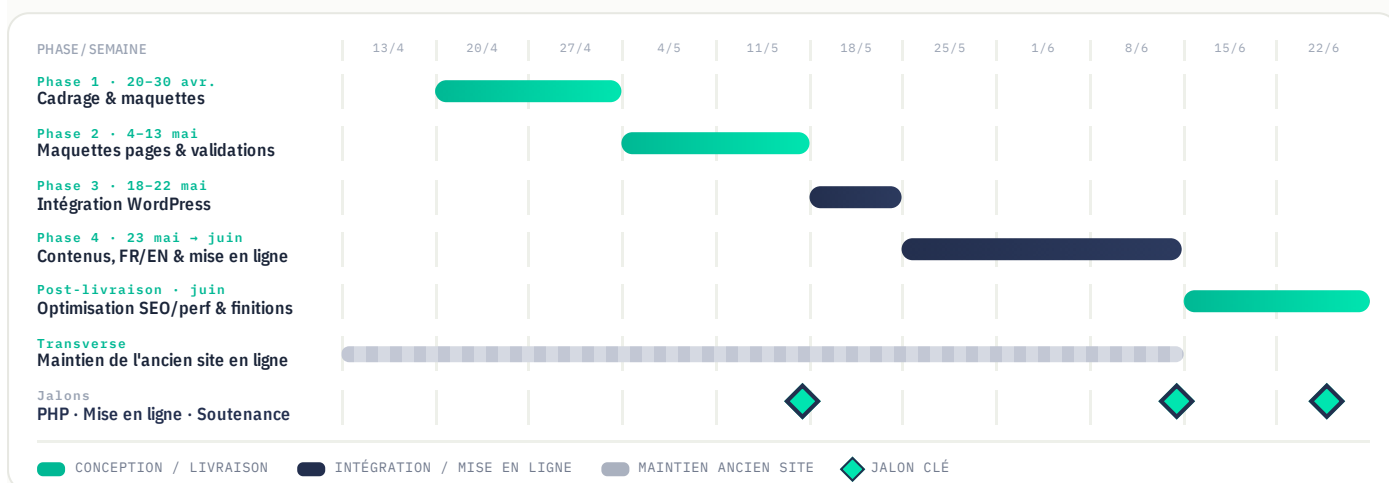

4 Détail des phases

PHASE 1 — 20 AU 30 AVRIL

Cadrage & maquettes

Analyse de l'existant, rédaction du cadrage, benchmark (Web Summit, VivaTech, Sido Lyon), premières maquettes Figma des pages clés en mobile-first.

PHASE 2 – 4 AU 13 MAI

Maquettes des pages & validations

Déclinaison de l'ensemble des pages, mise au point du design system, allers-retours et validation de la direction artistique claire avec l'équipe (réunion du 13/05).

PHASE 3 – 18 AU 22 MAI

Intégration WordPress

Déblocage PHP le 18/05, code lancé le 20/05 : montage de l'architecture (CPT, ACF), thème Astra + Elementor, premiers composants sur-mesure (shortcodes WPCode).

PHASE 4 – 23 MAI → JUIN

Contenus, bilingue & mise en ligne

Intégration de tous les contenus, version FR/EN (TranslatePress + i18n JS), finalisation des pages, puis bascule préproduction → production (domaine OVH).

POST-LIVRAISON – JUIN

Optimisation & passation

Audit Lighthouse (SEO & performance), corrections, finitions, préparation de la passation à l'équipe et de la soutenance.

5

Risques & aléas rencontrés

RISQUE / ALÉA	TRAITEMENT	STATUT
Version PHP trop ancienne bloquant Elementor	Pivot : maquettes avancées pendant la résolution, puis montée de version (18/05)	ABSORBÉ
Conflit du plugin de traduction sur la mise en page FR/EN	Corrigé avant la mise en ligne	RÉSOLU
Boucle de redirection à la bascule de domaine	Better Search Replace (données sérialisées) lors du swap OVH	RÉSOLU
